




# Proyectos de Inversión Servicio de Salud de Iquique



Gobierno  
de Chile

JUNIO 2019



## OBRAS TERMINADAS 2019




# CESFAM PEDRO PULGAR(AÑAZCO)

Actualmente en funcionamiento.-



# CESFAM HUARA



Actualmente en funcionamiento.-



# POSTA PISAGUA


Recinto entregado al Municipio, en trámite de la Autorización Sanitaria por parte de ellos.-



# POSTA CHANAVAYITA

Actualmente en marcha blanca, cuenta con Autorización Sanitaria N°1606, Fecha 18-06-2019





## OBRAS EN EJECUCIÓN 2019



# CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO

Se presenta la programación de obra con la que se está trabajando actualmente.

ETAPA (%)	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	PLAZO (días corridos)
ETAPA 1 (12,0 %)	17.05.2018	04.07.2019	414
ETAPA 2 (13,0 %)	05.07.2019	04.12.2019	153
ETAPA 3 (15,0 %)	05.12.2019	23.03.2020	110
ETAPA 4 (15,0 %)	24.03.2020	11.07.2020	110
ETAPA 5 (17,0 %)	12.07.2020	07.11.2020	119
ETAPA 6 (15,0 %)	08.11.2020	11.03.2021	124
ETAPA 7 (13,0 %)	12.03.2021	28.08.2021	170



## AVANCE DE OBRAS CORTE 5 DE JUNIO 2019

Físico Real: 12.16%

Físico Programado: 10.99%

Financiero Real: 0%

Financiero Programado: 0%



# SAR POZO ALMONTE

REGIÓN	TARAPACÁ
CÓDIGO BIP	30459401
NOMBRE PROYECTO	CONSTRUCCIÓN SAR POZO ALMONTE
PROVINCIA / COMUNA	POZO ALMONTE
ESTADO ACTUAL	EJECUCIÓN – (OBRA PARALIZADA POR TERMINO ANTICIPADO)
CONTRATISTA	LOMA VERDE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA
MONTO \$	\$1.143.070.346
MANDANTE / FINANCIAMIENTO	SERVICIO SALUD IQUIQUE/ MINISTERIO DE SALUD
LICITACIÓN / MODALIDAD CONTRATACIÓN	LICITACION PUBLICA Nº 1637-61-LR17
DESCRIPCIÓN PROYECTO	El proyecto está orientado a la construcción de un recinto de atención primaria de urgencia de alta resolución (SAR) de 524 m2, emplazado a un costado del CESFAM Pozo Almonte el cual funcionaría como complemento de este y complementaria la red asistencial de salud en la comuna de Pozo Almonte.
INICIO LEGAL CONTRATO	08.03.2018
ENTREGA DE TERRENO	05.04.2018
TÉRMINO LEGAL DE OBRAS	05.04.2019
PLAZO DE OBRAS	360 DIAS
TÉRMINO ANTICIPADO DE OBRA	Resolución Afecta N°288 de fecha 20 de noviembre del 2018, tomada Razón Contraloría 10-12-2018
PORCENTAJE DE AVANCE	52.33%
ESTADO ACTUAL	En licitación para retomar las obras inconclusas.-


# SAR POZO ALMONTE




# SAR LA TORTUGA

REGIÓN	TARAPACÁ
CÓDIGO BIP	30464301
NOMBRE PROYECTO	CONSTRUCCIÓN SAR LA TORTUGA, ALTO HOSPICIO
PROVINCIA / COMUNA	ALTO HOSPICIO
ESTADO ACTUAL	EJECUCIÓN
CONTRATISTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCION V&C S.A
MONTO M \$	\$1.279.244.311
MANDANTE / FINANCIAMIENTO	SERVICIO SALUD IQUIQUE/ MINISTERIO DE SALUD
LICITACIÓN / MODALIDAD CONTRATACIÓN	LICITACION PUBLICA Nº 1637-62 LR17
DESCRIPCIÓN PROYECTO	El proyecto está orientado a la construcción de un recinto de atención primaria de urgencia de alta resolución (SAR) de 524 m2, emplazado a un costado del CECOSF La Tortuga, el cual funcionaría como complemento de este y complementaria la red asistencial de salud en la comuna de Alto Hospicio.
INICIO LEGAL CONTRATO	28.12.2018
ENTREGA DE TERRENO	08.01.2019
TÉRMINO LEGAL DE OBRAS	08.01.2020
PLAZO DE OBRAS	360 DIAS
POCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA	13 %

# SAR LA TORTUGA

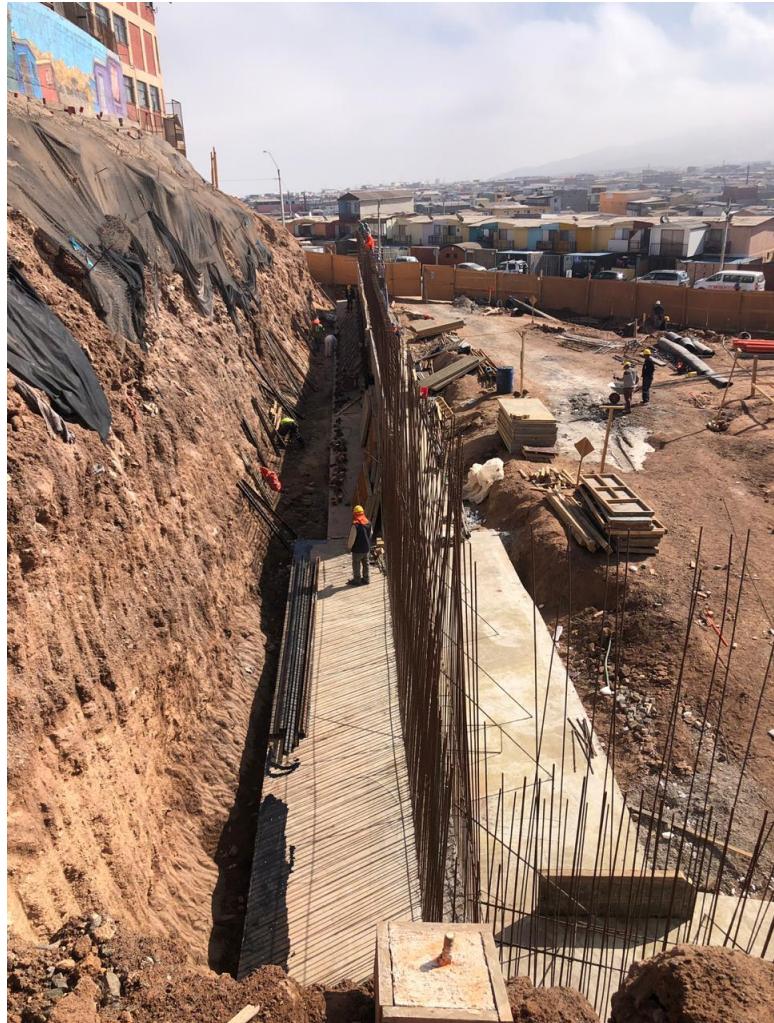



# PROYECTOS EN CONVENIO DE PROGRAMACIÓN

## 2018 - 2022

# SECTORIAL

Proyecto	ESTADO	Avances Servicio de Salud	TOTAL M\$
Construcción Hospital de Alto Hospicio	EJECUCIÓN	FÍSICO =13% A LA FECHA Se avanza en el hormigonado de los pilares del primer piso y enfierradura, losa, y cielo del primer piso y en proceso de instalación de los aisladores sísmicos	\$ 98.587.201
Ampliación de Unidad de Cuidados Intensivos	EJECUCIÓN	A través de oficio N°1301 de fecha 25 de Mayo de 2018 se solicita Pertinencia Técnica. Correo electrónico 04-06-2018, de Servicio de Salud de Iquique a Depto. de EPH, División de Inversiones MINSAL, se solicita dar respuesta a oficio. Correo electrónico 10-09-2018, de Servicio de Salud de Iquique a Depto. de EPH, División de Inversiones MINSAL, se solicita dar respuesta a Oficio. A través de oficio N°395 de fecha 28 de diciembre de 2018, se envía perfil solicitado Una vez obtenido el Certificado de Pertinencia se postulará el proyecto a MIDESO.	\$ 2.230.693
Ampliación de Anatomía Patológica	EJECUCIÓN	A través de oficio N° 2023 de fecha 01 de agosto de 2018 se solicita Pertinencia Técnica. Correo electrónico 04-06-2018, se solicita dar respuesta a oficio. Correo electrónico 10-09-2018, se solicita dar respuesta a Oficio. Se envía oficio N°1197 de fecha 25-04-2019 donde se solicita pertinencia técnica de equipo y equipamiento Se envía oficio N°1274 de fecha 03-05-2019 donde se solicita incorporar al Sistema Nacional de Inversiones A través de oficio N°1274 03-05-2019 de Subsecretario de Redes Asistenciales a SSI , se solicita la revisión de la Cartera de Prestación APA con nueva Cartera de Prestación Onco definida el día 15 de mayo de 2019	\$ 1.588.020
Reposición Equipos de Anatomía Patológica	EJECUCIÓN	Se envía a revisión MINSAL en ordinario N°1197 de fecha de fecha 25 de abril de 2019	\$ 250.316
Centro de Diagnóstico y Terapéutico (CDT)	PREFACTIBILIDAD	Por no contar con equipo Técnico por parte del Servicio de Salud de Iquique, se solicita contratar el estudio de Prefactibilidad Para ello se propone rebajar en M\$250.000 en el ítem de Obras Civiles e Incorporarlos al Estudio Se comenzará a trabajar en Término de referencias	\$ 250.000

# SECTORIAL

Proyecto	ESTADO	Avances Servicio de Salud	TOTAL M\$
Centro de Diagnóstico y Terapéutico (CDT)	DISEÑO	Una vez terminado la pre factibilidad se comenzará con la el diseño	\$ 280.000
Centro de Diagnóstico y Terapéutico (CDT)	EJECUCIÓN	Una vez terminado el diseño se comenzará con la ejecución	\$ 353.601
Mejoramiento Neontología HETG	EJECUCIÓN	Se incorpora proyecto modificando tanto el primer como el segundo piso de Neo del HETG	\$ 800.000

# SECTORIAL

Proyecto	ESTADO	Avances Servicio de Salud	TOTAL M\$
Normalización Hospital Ernesto Torres G.	PREFACTIBILIDAD	<p>De acuerdo al Rediseño de la Red Resolución Exenta del Servicio de Salud de Iquique N°1244 de fecha 30-06-2016, actualmente vigente, se define que es necesario la Normalización del único hospital regional, basado en los cambios del perfil epidemiológico, demográfico, y las exigencias Normativas, sumado al nuevo hospital de Alto Hospicio, por lo que se hace necesario la complejización de la atención.</p> <p>De acuerdo a esto se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>Se nombra por resolución del Servicio de Salud N°1992 de fecha 13 de abril de 2018 la Comisión Ejecutiva y el Comité Técnico, para trabajar los 7 proyectos hospitalarios que son parte del convenio de programación GORE – MINSAL 2018 – 2022.</p> <p>En resolución N°841 de fecha 10-05-2018, del Hospital Ernesto Torres G., se nombra la Comisión Técnica del Hospital. los 7 proyectos hospitalarios.</p> <p>En reunión sostenida el día 05-06-18, en Comité Ejecutivo se aprueba cronograma de trabajo</p> <p>Se trabaja en la conformación de la Comisión Técnica interna para el levantamiento de los Términos de Referencia para el estudio.</p> <p>Una vez estén listos los antecedentes se solicitará pertinencia técnica al MINSAL fines del año 2019.</p> <p>Solicitud de RATE de prefactibilidad primer trimestre 2020, para licitar segundo trimestre de 2020.</p>	\$ 210.000
Normalización Hospital Ernesto Torres G.	DISEÑO	Una vez terminado el estudio de prefactibilidad se postulará a revisión de MIDESO para etapa de Diseño segundo semestre 2022, para licitar diseño fines 2022	\$ 280.000
Normalización Hospital Ernesto Torres G.	DISEÑO	Una vez terminado el diseño se postulará a la etapa de ejecución	\$ 380.000

# SECTORIAL

Proyecto	ESTADO	Observaciones Servicio de Salud	TOTAL M\$
Habilitación y Mejoramiento de la Red Oncológica de Tarapacá	PREFACTIBILIDAD	<p>Término de estudio octubre de 2018</p> <p>Se envía Oficio N°589 de 28 de febrero de 2019, donde se solicita revisión de todos los módulos del Estudio y a su vez se solicita agilizar trámite de revisión</p> <p>Del estudio se encuentra en revisión por parte del MINSAL</p> <p>A la fecha se encuentra aprobado el Modelo de Gestión y la Cartera de Prestaciones</p> <p>MINSAL informa el día viernes 06-06, que el Módulo de Producción tendrá modificaciones, que serán informadas el día lunes 10-06 al SSI</p> <p>Se trabajarán paralelamente los Módulos de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RRHH</li> <li>TICS</li> <li>EQUIPO Y EQUIPAMIENTO</li> <li>PMA</li> </ul> <p>Con fecha de término 13 de junio, para comenzar a trabajar en Sustentabilidad Financiera</p> <p>En día 28-07-2019 se terminará estudio para postularlo a la etapa de Diseño</p>	\$ 196.564
Construcción Centro Oncológico Región de Tarapacá	DISEÑO	A través de Ordinario C42 N°4358 de fecha 10-10-2018, desde MINSAL se solicita al SSI cambio de fuente de financiamiento de FNDR a Sectorial	\$ 250.000
Construcción Centro Oncológico Región de Tarapacá	EJECUCIÓN	Una vez terminado el diseño se postulará a la etapa de ejecución	\$ 14.809.604
Construcción SAR Pozo Almonte	EJECUCIÓN	<p>La obra tiene un 52,3% de avance físico, con obra gruesa terminada y terminaciones con avance de 30%</p> <p>Se declara desierta la licitación por falta de antecedentes y presupuestos muy elevados de los oferentes</p>	\$ 1.567.053
Construcción SAR La Tortuga, Alto Hospicio	EJECUCIÓN	<p>1. Se realiza entrega de terreno el día 08-1-2019 se avanza en el trazado del recinto</p> <p>Las Notas de cambio por socavón fueron rechazadas por el jefe de RRFF por falta de información, la empresa está trabajando en rectificar la Nota de cambio, que la remitirá nuevamente a análisis de RRFF en el transcurso de la semana del 10-06</p> <p>De acuerdo a contrato esta obra debería terminar en enero de 2020</p>	\$ 2.045.699

# SECTORIAL


Proyecto	ESTADO	Avances Servicio de Salud	TOTAL M\$
REPOSICION CESFAM SUR	DISEÑO	SE INCORPORA COMO NUEVO PROYECTO	\$ 160.000
REPOSICION CESFAM SUR	EJECUCIÓN	SE INCORPORA COMO NUEVO PROYECTO	\$ 4.500.000
REPOSICION CESFAM GUZMAN	DISEÑO	SE INCORPORA COMO NUEVO PROYECTO	\$ 160.000
REPOSICION CESFAM GUZMAN	EJECUCIÓN	SE INCORPORA COMO NUEVO PROYECTO	\$ 4.500.000
REPOSICION CESFAM AGUIRRE	DISEÑO	SE INCORPORA COMO NUEVO PROYECTO	\$ 160.000
REPOSICION CESFAM AGUIRRE	EJECUCIÓN	SE INCORPORA COMO NUEVO PROYECTO	\$ 4.500.000

# SECTORIAL

Proyecto	ESTADO	Avances Servicio de Salud	TOTAL M\$
Construcción CESFAM Altos de Playa Blanca	DISEÑO	Se envió ORD. 1112, Fecha 18-04-2019, de Servicio de Salud a MINVU, nuevo estudio de DDA. De acuerdo a la nueva producción, para su información y pronunciamiento.-	\$ 157.845
Reposición 3 ambulancias para el Servicio de Atención Médica de Urgencia, HETG	EJECUCIÓN	Decreto Tomado Razón por parte de la Contraloría, en espera de licitación por parte del MINSAL	\$ 310.500

# SECTORIAL


Proyecto	ESTADO	Avances Servicio de Salud	TOTAL M\$
Vehículo de Atención Domiciliaria	EJECUCIÓN	En ordinario N°1785 de fecha 03 de mayo de 2019, se postula a pertinencia técnica y financiamiento a la Subsecretaría de Redes Asistenciales	\$ 17.775
Pabellon a Punto Etapa II	EJECUCIÓN	En ordinario N°1054 de fecha 12 de Abril de 2019, se solicita financiamiento a la Subsecretaría de Redes Asistenciales/ LOS MONITORES Y LAS MÁQUINAS DE ANESTESIA SERÁN FINANCIADO POR EL FNDR, se envía a GORE a través de ordinario N°1439 de fecha 17-05-2019	\$ 1.292.043
Vehículo de Atención Domiciliaria CESFAM H. Reyno	EJECUCIÓN	SE INCORPORA COMO NUEVO PROYECTO	\$ 57.894
Reposición Ambulancias HETG	EJECUCIÓN	SE INCORPORA COMO NUEVO PROYECTO	\$ 347.364
Reposición de Vehículos del SSI	EJECUCIÓN	SE INCORPORA COMO NUEVO PROYECTO	\$ 202.851
<b>TOTAL SECTORIAL M\$</b>			<b>\$ 146.495.391</b>



Proyecto	ESTADO	Avances Servicio de Salud	TOTAL M\$
Reposición de Ascensores	EJECUCIÓN	Actualmente se encuentra en licitación según ID1057448-8-LR19por tercera Vez	\$ 246.612
Reposición Posta de Salud Rural La Tirana	EJECUCIÓN	Convenio Mandato con observaciones por parte del Depto Jurídico del SSI/ se devuelve a través de ordinario N°1617 de fecha 07-06 al GORE para realizar correcciones	\$ 940.854
Construcción Posta de Salud Rural de Cariquima	EJECUCIÓN	Aprobado por CORE para financiamiento el día 23-05, a la espera de Convenio Mandato por parte del GORE	\$ 1.220.025
Reposición Centro de Salud Mental Dr. Salvador Allende de Iquique	EJECUCIÓN	<p>El día 08-03-2019 se envía ordinario N°689 con antecedentes técnicos para Pertiencia Técnica, donde se da respuesta al ordinario C21 -04 del día 02-01-2019, donde se indica que no se cumple cn PMA de acuerdo a Modelo de Gestión.</p> <p>En Ordinario del SSI se solicita reevaluar la observación puesto que ya se pagó el diseño que partió en diciembre de 2014, y con fecha de término 19-11-2018, con solicitud de permiso de construcción, la proyecto Manager con su equipo de proyectos está evaluando esta solicitud</p> <p>Se reitera a través de oficio N°1311, de fecha 07-05-2019, la solicitud de mantener PMA Diseñado</p>	\$ 1.070.106
Ampliación y Remodelación Jardín Infantil y Sala Cuna Capullito HETG.	EJECUCIÓN	<p>Se nombra por resolución del Servicio de Salud N°1992 de fecha 13 de abril de 2017 el Comisión Ejecutiva y el Comité Técnico, para trabajar los 7 proyectos hospitalarios que son parte del convenio de programación GORE – MINSAL 2017 – 2021.</p> <p>El día 29-04-2019, se incorporan todos los antecedentes técnicos a la carpeta digital del proyecto, se tramita oficio para ser enviado a MINSAL.</p> <p>A través de Oficio N°1228, de fecha 29-04-2019 de Servicio de Salud a Subsecretaría de Redes Asistenciales, se informa que se han incorporado todos los antecedentes técnicos del Proyecto</p>	\$ 1.865.000




# F.N.D.R.



Proyecto	ESTADO	Observaciones Servicio de Salud	TOTAL M\$
Reposición con relocalización Centro de Salud Camiña	DISEÑO	<p>Ord. 221 de fecha 25/01/2019 del Director SSI a la municipalidad Camiña reitera solicitud de un nuevo terreno CESFAM Camiña,</p> <p>Ord. 614 de fecha 01/03/2019 del director SSI a la Municipalidad de Camiña reitera solicitud de terreno para el proyecto CESFAM Camiña</p> <p>Ord. 647 de fecha 06/03/2019 del director SSI a SERVIU Tarapacá solicita informar sobre disponibilidad de terrenos</p> <p>Ord. 646 de fecha 06/03/2019 director SSI seremi Bienes Nacionales solicita información de terrenos en la localidad de Camiña</p> <p>Ord. 643 de fecha 06/03/2019 del director SSI a Servicio Impuestos internos solicita información de precios de terrenos</p> <p>Ord. 1047 de fecha 27/04/2018 de la directora SSI a Municipalidad de Camiña estado de gestión por parte de la municipalidad de Camiña, respecto a la definición específica del terreno para el proyecto CESFAM Camiña.</p> <p>Ord. 2166 de fecha 17/08/2018 de la directora SSI Municipalidad Camiña reitera solicitud de nuevo terreno para desarrollo proyecto.</p> <p>Ord. 3048 de fecha 08/11/2018 de la directora SSI Municipalidad Camiña solicita entrega de terrenos para el desarrollo del proyecto.</p> <p>Debido a la dificultad de búsqueda de terreno, el Depto. De RRFF está trabajando en un estudio de cabida del terreno de la Posta Actual para presentar una propuesta de anteproyecto.</p> <p>Se envía a través de ordinario N°1583, fecha 04/06/2019, Propuesta estudio cabida, posta actual.</p>	\$ 160.000
Reposición con relocalización Centro de Salud Camiña	EJECUCIÓN	Una vez terminado el Diseño se trabajará en el proyecto de ejecución	\$ 3.500.000




# F.N.D.R.




Proyecto	ESTADO	Observaciones Servicio de Salud	TOTAL M\$
Reposición con relocalización Centro de Salud Colchane	DISEÑO	<p>Ord. 190 de fecha 22/01/2019 de la Directora SSI Municipalidad Colchane solicitud de pronunciamiento Terreno CESFAM Colchane CESFAM</p> <p>Ord. 613 de fecha 01/03/2019 de la Directora Director SSI Municipalidad de Colchane Emplazamiento Terreno Posta Colchane</p> <p>Ord. 1041 de fecha 26/04/2018 de la Directora SSI SERPLAC Municipalidad de Colchane estado de gestión por parte de La Municipalidad de Colchane, Respecto a la definición específica del terreno para el proyecto CESFAM Colchane</p> <p>Ord. 1947 de fecha 26/07/2018 de la Directora SSI Municipalidad Colchane consulta estado de gestiones en pertinencia a terreno destinado al proyecto normalización posta de salud rural de Colchane.</p> <p>Ord. 1948 de fecha 26/07/2018 de la Directora SSI Municipalidad Camiña consulta estado de gestiones en pertinencia a terreno destinado al proyecto CESFAM Colchane.</p> <p>Ord. 3049 de fecha 08/11/2018 de la Directora SSI Municipalidad Colchane solicita entrega de antecedentes para emplazamiento del proyecto posta Colchane.</p> <p>Ord. 3571 de fecha 27/12/2018 de la Directora SSI Municipalidad de Colchane Solicita Pronunciamiento Respecto Terreno CESFAM.</p>	\$ 160.000
Reposición con relocalización Centro de Salud Colchane	EJECUCIÓN	Una vez terminado el Diseño se trabajará en el proyecto de ejecución	\$ 4.000.000





Proyecto	ESTADO	Avances Servicio de Salud	TOTAL M\$
Construcción Hospital de Alto Hospicio (Urbanización)	EJECUCIÓN	<p>Primera Fase Ejecución: Cierre Perimetral del Hospital por M\$177.026, (terminado) Segunda Fase Ejecución: 95% ejecutado Obras de Urbanización que contempla por M\$2.691.293:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agua Potable-Alcantarillado,</li> <li>- Alumbrado Público</li> <li>- Pavimentación 2do Acceso Iquique-Alto Hospicio</li> <li>- Diseños y los estudios de mecánica de suelos enfocados a determinar la salinidad del suelo</li> </ul> <p>Tercera Fase Ejecución: M\$1.016.030 Se iniciará esta fase una vez esté construido el Hospital</p>	\$ 4.529.000
Centro de Referencia Odontológico	EJECUCIÓN	<p>Se trabaja en las soluciones alternativas del proyecto Se presenta a DIGERA proyecto de compra de 6 sillones dentales Se trabaja en el diseño de las especialidades</p>	\$ 96.000
Construcción CESFAM Altos de Playa Blanca	EJECUCIÓN	Proyecto en su etapa de Diseño en evaluación	\$ 6.000.000
Equipos de la Unidad de Colonoscopia del Hospital Ernesto Torres G.	EJECUCIÓN	Proyecto totalmente ejecutado	\$ 354.610
Ambulancias para la Atención Primaria de Urgencia	EJECUCIÓN	Proyecto aprobado por CORE el 23-05	\$ 115.787
Reposición Máquinas de Anestesiapabellón Gineco - Obstétrico	EJECUCIÓN	Que por Ordinario N°1439 de fecha 17-05-2019, se solicita a Intendente Revisión de Antecedentes del proyecto	\$ 117.096
Construcción pabellón quirúrgico Unidad Cirugía Plástica y Gran Quemado	EJECUCIÓN	Proyecto Nuevo que se incorpora al Convenio de Programación	\$ 2.000.000
<b>TOTAL FNDR M\$</b>			<b>\$ 26.375.090</b>





## PROYECTOS DE CONSERVACION

## LLUVIAS FEBRERO 2019





## SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES

División de Presupuesto

Gestión Presupuestaria

SERVICIO DE SALUD IQUIQUE  
DEPTO. INVERSIONES Y PROYECTOS

Nº:

Fecha: 10 MAYO 2019

Destinatario:

C.C.:

1989

ORD. N°C71 :

ANT. :

MAT. : Solicitud recursos adicionales para la reparación de infraestructura de Hospitales.  
30 ABR 2019

Santiago,

DE: SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES  
MINISTERIO DE SALUD

A : DIRECTOR DE PRESUPUESTOS  
MINISTERIO DE HACIENDA


Junto con saludar, y en el marco de la alerta roja que se produjo en el norte del país durante el primer trimestre del año 2019 producto de las lluvias, informo a usted que se produjeron daños estructurales en Hospitales, CESFAM, SAR, COSAM, CECOSF, SAPU, Postas y Centros de Salud Rurales, entre otros, pertenecientes a los Servicios de Salud Arica, Iquique y Antofagasta.

Es fundamental que, para prestar atención oportuna y de calidad a las personas de la región y para el correcto funcionamiento de estas dependencias de salud, se realicen en el corto plazo las reparaciones necesarias. A continuación, se da a conocer las necesidades de cada establecimiento por Servicio de Salud.

## IQUIQUE

Los daños en dependencias de salud pertenecientes al Servicio de Salud Iquique alcanzan un monto de \$2.709.504.000, según detalle adjunto:

SERVICIO DE SALUD	COMUNA	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO \$	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA
IQUIQUE	Iquique	Conservación Cubiertas, Cielos Falso, Sistema Eléctrico Y Muros, SAR sur	113.840.000	Rediseñar techumbre, canales y bajadas de aguas lluvias, para construir solución definitiva-Dar pendiente a cubierta y cambio de membrana. Rediseño y cambio de cubiertas menores. Dar solución a canales y bajadas de aguas lluvias. Cambiar planchas, caballetes y canales oxidados. Reparar oxidaciones menores y pintar la cubierta; En áreas críticas (rayos, Box dentales, Farmacia, Tic, esterilización y otras.) impermeabilizar losa bajo cubierta. Cambiar bajadas de aguas lluvias de PVC de 40mm a PVC de 75 o 110mm, según cálculo de caudal de canales. Reparar en forma definitiva recintos afectados después de resuelta solución de cubierta.
	Iquique	Conservación De Cubiertas, Techos, Cielos CESFAM sur	366.873.000	
	Iquique	Conservación Techo, Cielos, Cubiertas, Estructura Soportante Del Laboratorio CESFAM	39.408.000	
	Iquique	Conservación De Cubiertas, Techos, Cielos CESFAM Aguirre	351.085.000	
	Iquique	Conservación De Cubiertas, Techos, Cielos CESFAM Guzmán	285.807.000	
	Iquique	Conservación Techos, Cielos Y Pisos De COSAM Seguel	9.785.000	
	Iquique	Conservación De Cubiertas, Techos, Cielos, Sistema Eléctrico COSAM París	81.550.000	
	Alto Hospicio	Conservación De Cubierta, Cielo Falso Y Muros CESFAM H. Reyno	684.205.000	
	Alto Hospicio	Conservación De Cubiertas, Techos, Cielos, CESFAM Pedro Pulgar	254.962.000	
	Alto Hospicio	Conservación De Cubiertas, Techos, Cielos Y Sistema EléctricoCCR, Alto Hospicio	95.404.000	
	Alto Hospicio	Conservación De Cubiertas, Techos, Cielos E Instalaciones Eléctricas CECOSF El Boro	68.986.000	
	Alto Hospicio	Conservación SAPU Pedro Pulga	64.559.000	
	De Colchane	Conservación Postas Y Centros De Salud Rural En La Comuna De Colchane	149.400.000	
	Camiña	Conservación Postas Y Centros De Salud Rural En La Comuna De Camiña	57.641.000	
	Huara	Conservación De Postas Y Centros De Salud Rural En La Comuna De Huara	31.357.000	
	Pica	Conservación De Postas Y Centros De Salud Rural En La Comuna De Pica	25.398.000	
	Pozo Almonte	Conservación De Postas Y Centros De Salud Rural En La Comuna De Pozo Almonte	28.233.000	



## **FIN DE LA PRESENTACION**

